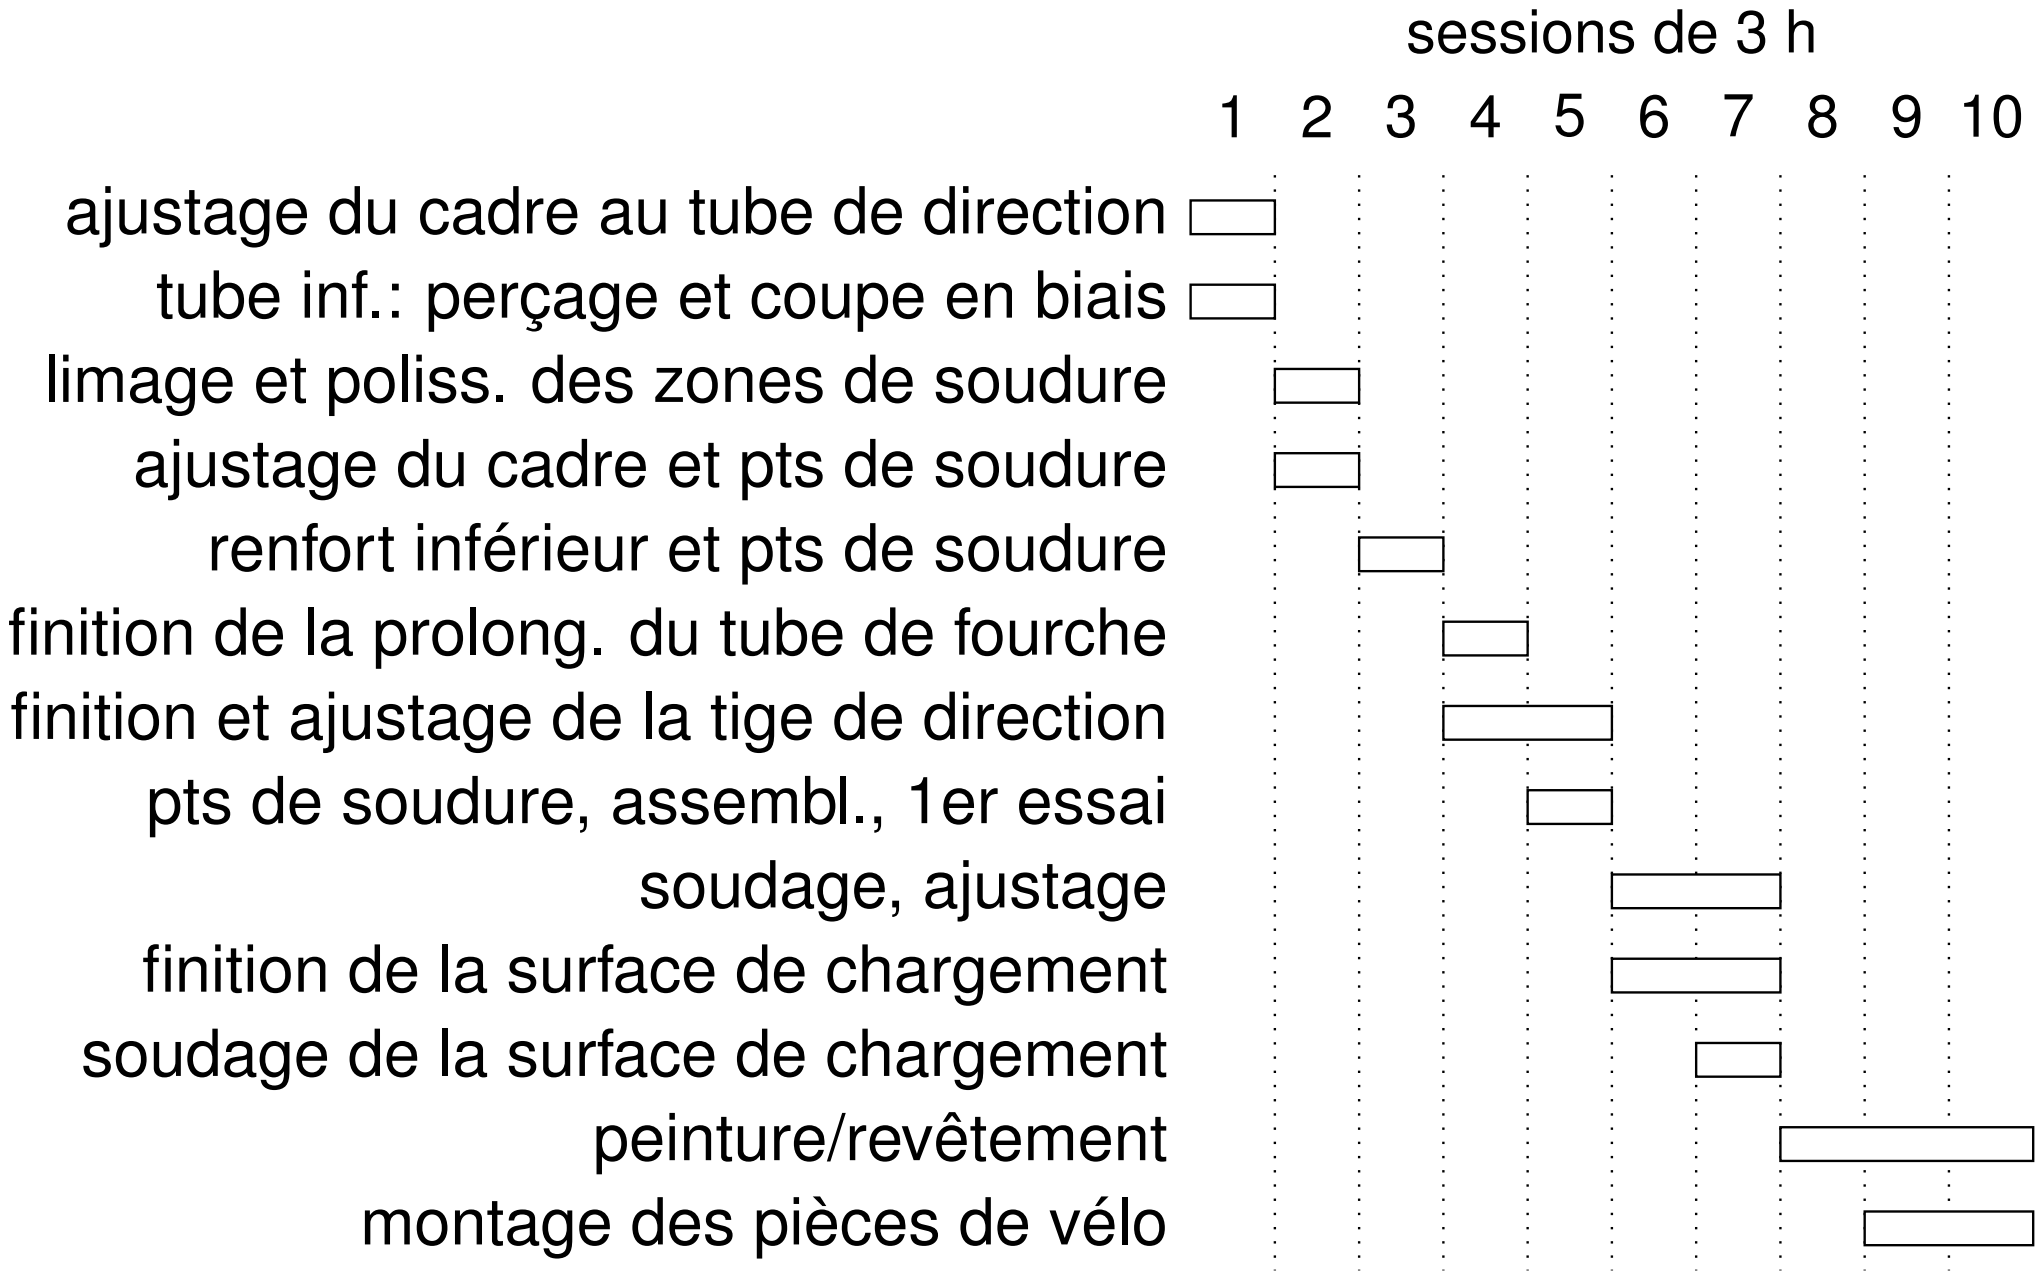
sessions de 3 h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ajustage du cadre au tube de direction
tube inf.: perçage et coupe en biais
limage et poliss. des zones de soudure
ajustage du cadre et pts de soudure
renfort inférieur et pts de soudure
finition de la prolong. du tube de fourche
finition et ajustage de la tige de direction
pts de soudure, assembl., 1er essai
soudage, ajustage
finition de la surface de chargement
soudage de la surface de chargement
peinture/revêtement
montage des pièces de vélo
